| | | |
|---|---|---|
| SYNDICAT RIVIÈRES SALAT-VOLP | **FICHE BILAN TRAVAUX** | **03/2022** |

# TRAVAUX DE GESTION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES ET DU LIT DU SALAT ET AFFLUENTS – ANNÉE 2021

| | |
|---|---|
| **Travaux** | Lot 2 - Lez et affluents |
| **Commune** | Sentein - Bonac-Irazein - Bordes-Uchentein |
| **Cours d'eau** | Lez - Ribérot - Isard |
| **Montant des travaux** | 14 880 € HT |
| **Entreprise** | Entreprise Noureau |
| **Moyen mis à disposition** | Tracteur forestier + bucherons + broyeur de branches |
| **Durée des travaux** | 12 jours du 19/01/2022 au 09/02/2022 |
| **Financements** | RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Liberté Égalité Fraternité) — 50 %<br>GRAND SUD-OUEST AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE — 50 %<br>Ariège Pyrénées le Département 09 — 35 %<br>SYNDICAT RIVIÈRES SALAT-VOLP — 15 % |

## 1- Localisation géographique

### • Le Lez

- **• Délimitation géographique des travaux :** Prise d'eau Eylie - Barrage de Bonac
- **• Distance :** ~ 8 800 m de cours d'eau
- **• Repères cartographiques :**

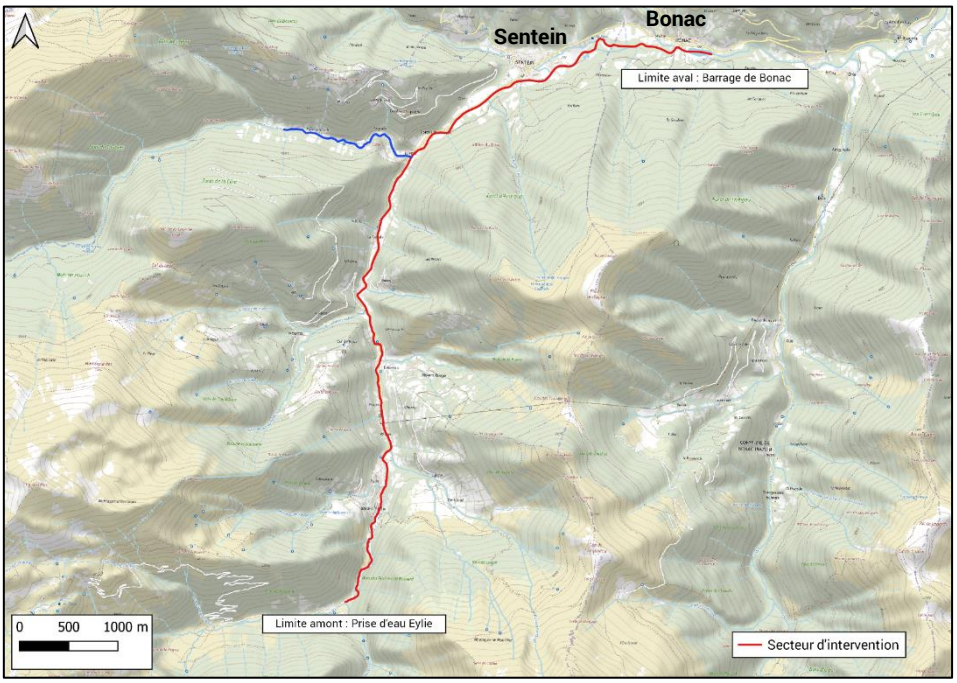


### • Le Ribérot

- **• Délimitation géographique des travaux :** Pla de la Lau - Confluence Lez
- **• Distance :** ~ 6 400 m de cours d'eau
- **• Repères cartographiques :**

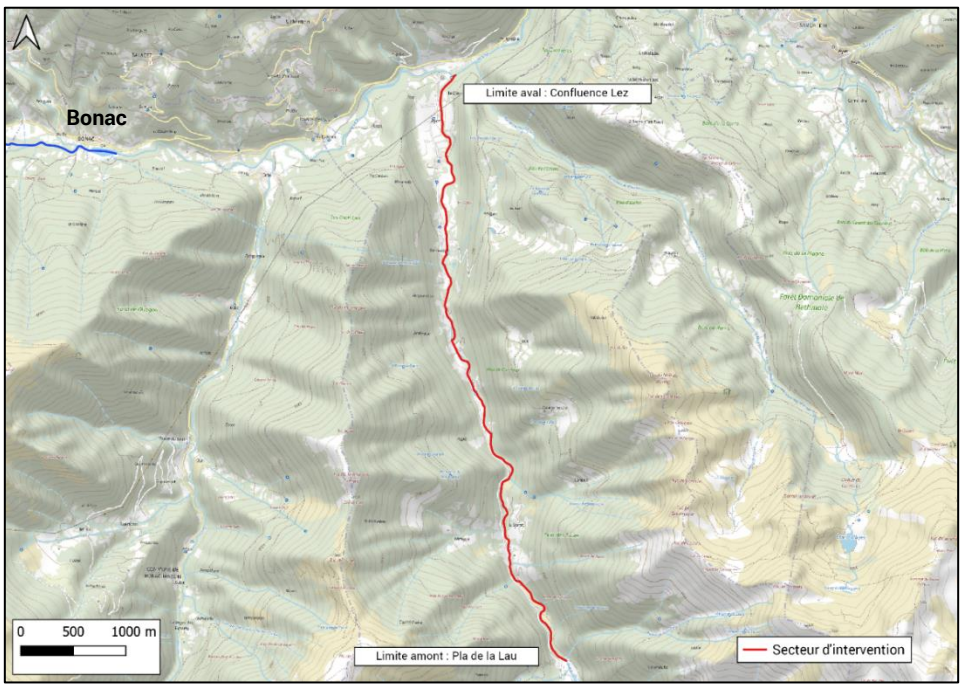

**• L'Isard**

**• Délimitation géographique des travaux :** Hameau de Cabilach - Confluence Lez
**• Distance :** ~ 1 600 m de cours d'eau
**• Repères cartographiques :**

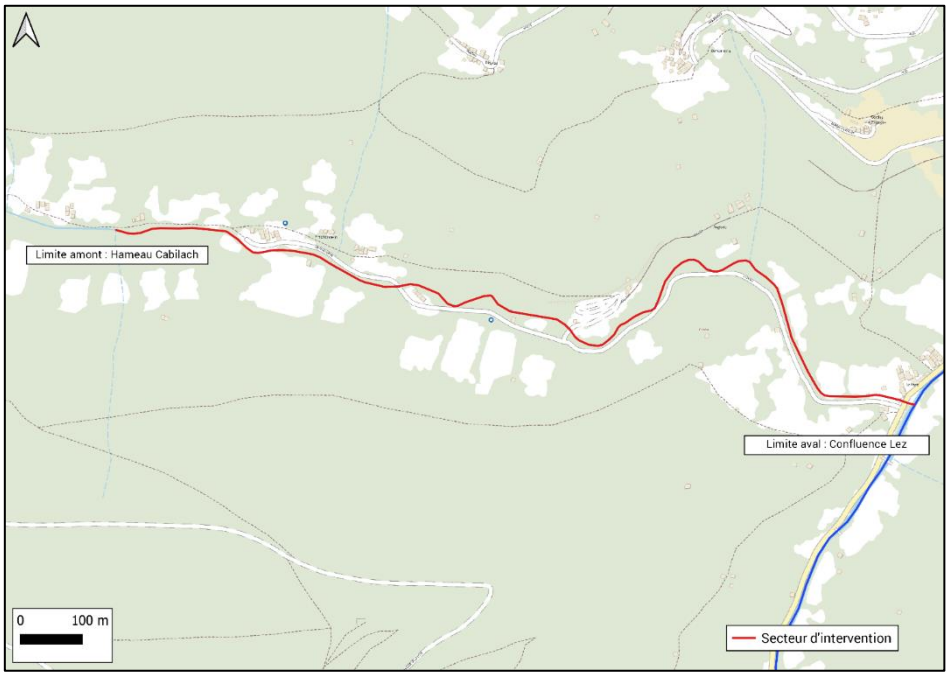


## 2 - Consistance des travaux

- enlèvement des arbres en travers et des embâcles ;
- coupe sélective avec abattage des arbres faisant obstacle à l'écoulement des eaux, présentant un risque de chute ou de déstabilisation des berges (arbres et cépées fortement penchés, affouillés, glissés, morts ou dépérissants) ;
- arasement total de la végétation de certains bancs alluviaux.

Différents exemples d'opérations réalisées lors de cette tranche d'entretien sont illustrés ci-après par des photographies prises avant et après travaux :

• Abattage arbres déstabilisés sur le Lez entre Sentein et Bonac :

***Avant travaux :***

***Après travaux :***

• Enlèvement chablis sur le Ribérot :

***Avant travaux :***

***Après travaux :***

## 3 - Bilan des travaux

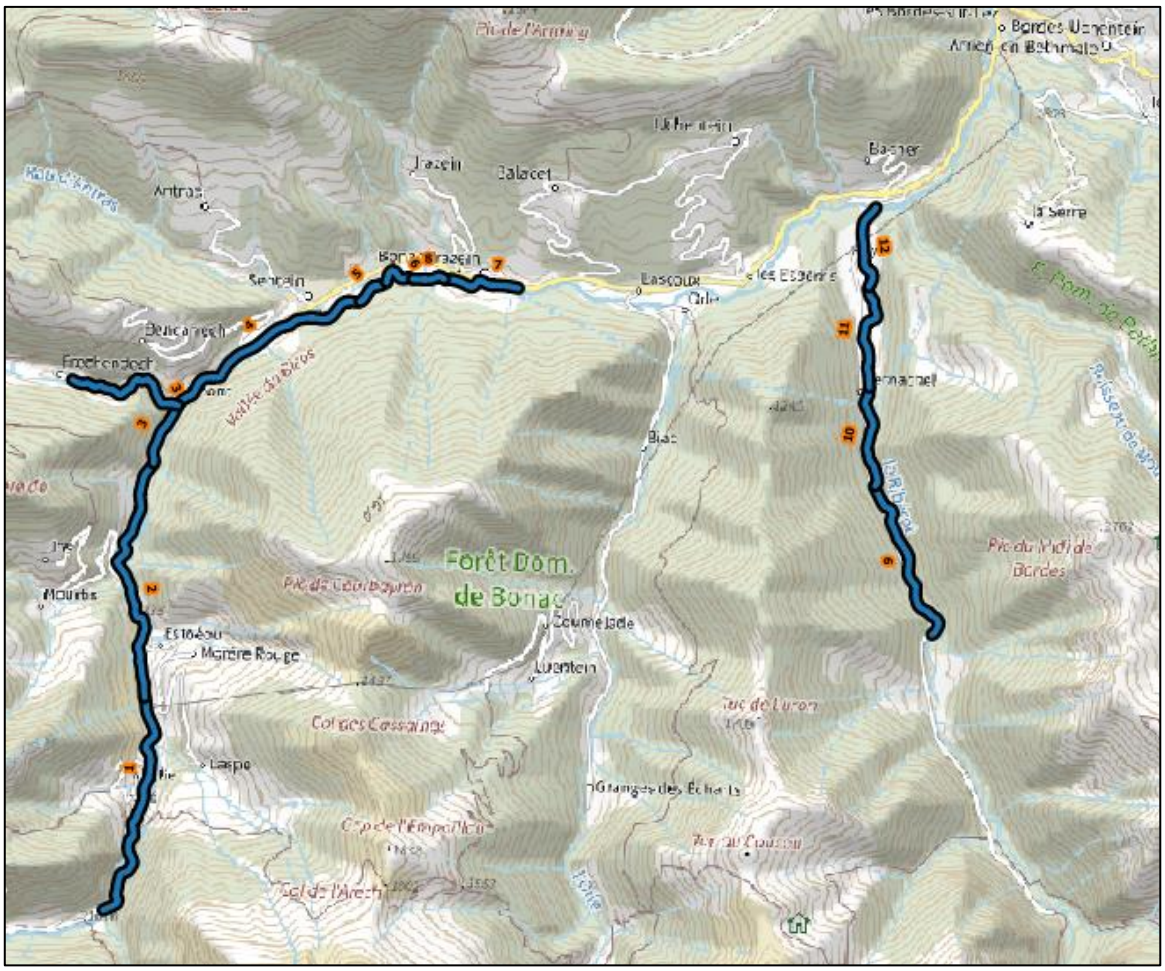


Les techniciens rivière du SSV suivent et contrôlent les travaux réalisés par les entreprises. Sur la carte ci-dessus, sont représentés les travaux effectués. Ce suivi est rentré sous SIG. Les numéros sur fond orange correspondent à un jour de chantier.

Le chantier a été achevé en 12 jours, du 19 janvier 2022 au 9 février 2022.
